

九州自動車道 主な被災箇所と復旧の取り組み

4/20(水)
5:00時点



ましき 益城バスストップ付近

盛土法面の崩落



崩落延長
約30~40m




⇒土留め工事実施中

きやまがわ 木山川渡河部

木山川橋 (橋長約870m(32径間))
桁のずれ



開き
約30~40cm

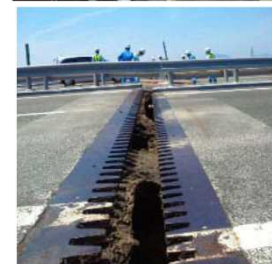


段差
約20cm

⇒ベント(橋梁を支える設備) 設置作業中

みどりかわ 緑川PA付近

府領跨道橋
(熊本県管理: 橋長約60m)
高速道路上に落橋
⇒橋桁の切断作業中



くまもと 熊本IC付近

神園跨道橋※他2橋
(※熊本市管理: 橋長約50m)
橋脚傾斜



⇒神園跨道橋にベント (橋梁を支える設備) を設置完了
